Būvdarbu līguma plānotais laika grafiks

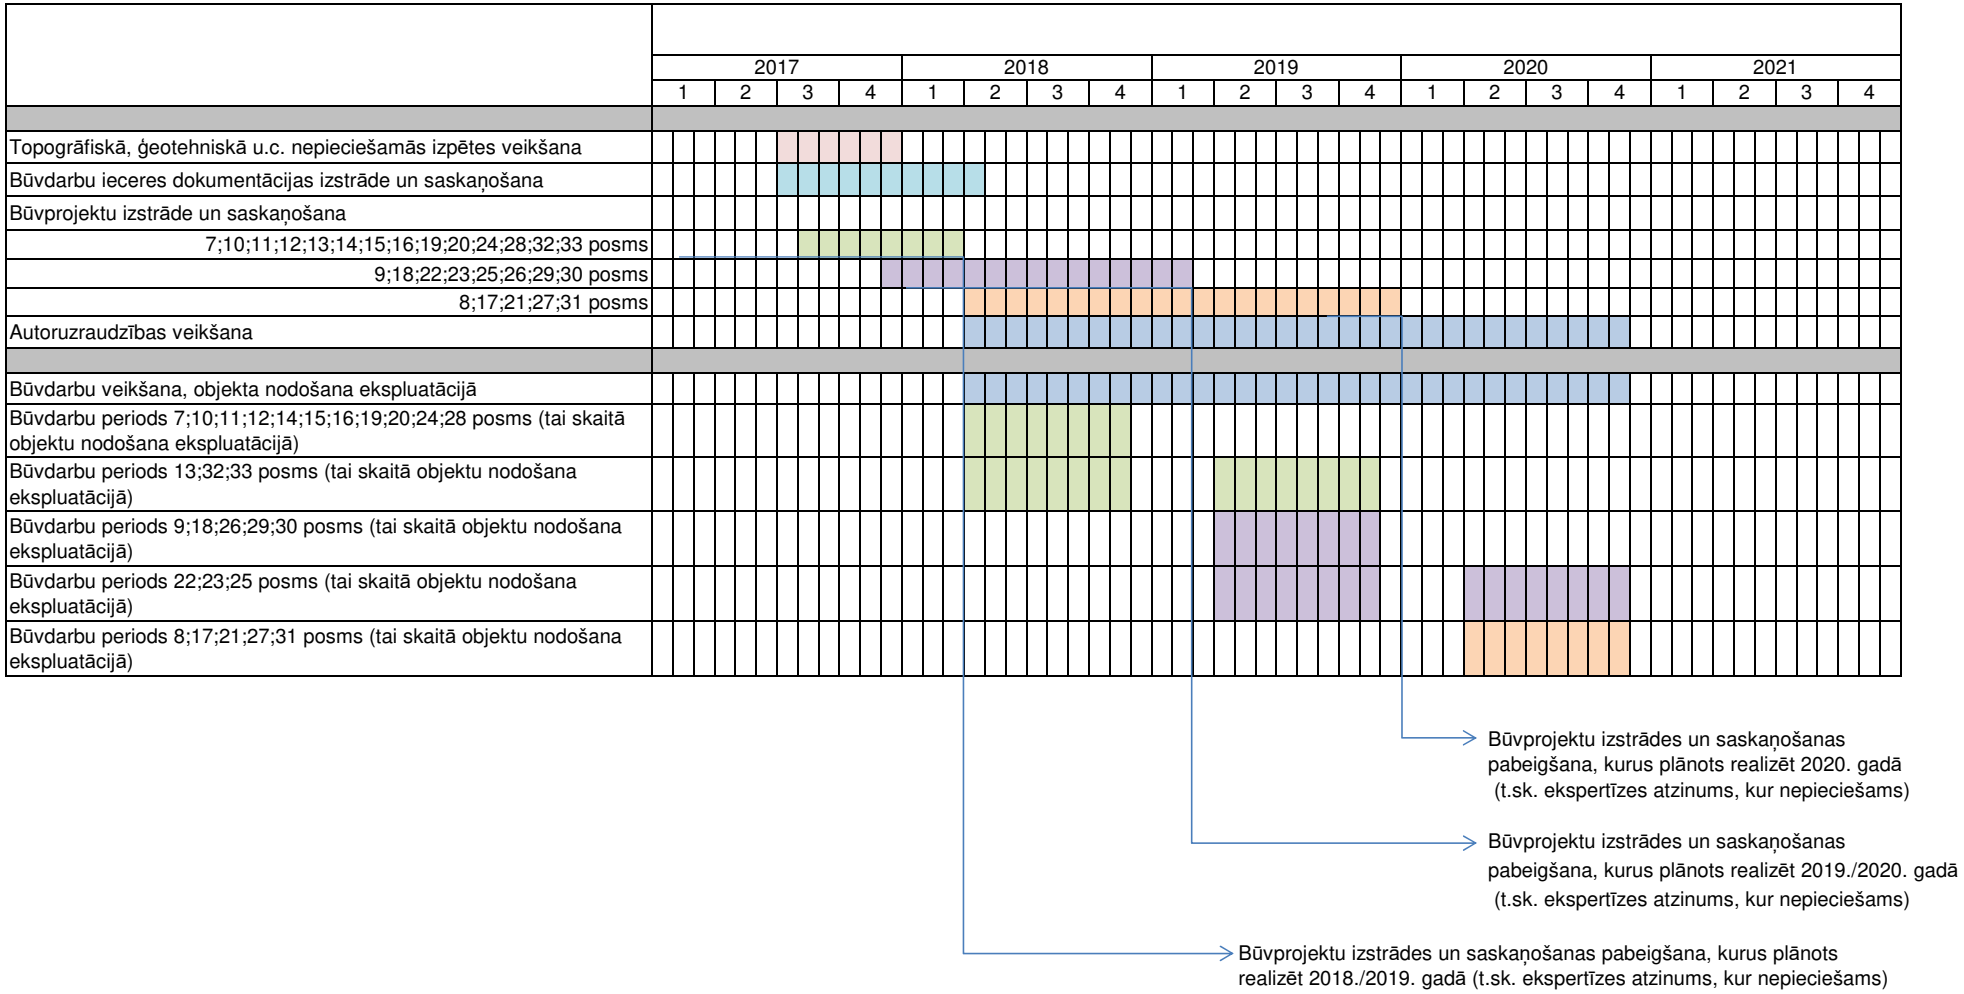

Piezīmes:

1. Uzņēmējs var uzsākt konkrēto posmu projektēšanu arī agrāk, bet visiem būvprojektiem jābūt izstrādātiem un saskaņotiem ne vēlāk kā līdz 2020. gada 2. janvārim.
2. Projekta atsevišķie posmi realizējami sekojošā secībā:
3. 2018. gads: 7;10;11;12;14;15;16;19;20;24;28 posms
4. 2019. gads: 9;18;26;29;30 posms
5. 2020. gads: 8;17;21;27;31 posms
6. 13;32;33 posmu realizāciju (būvdarbus) rekomendēts veikt 2018./2019. gadā. Ziemas periodā darbus atļauts veikt, ja ir atbilstoši laika apstākļi, kā arī saņemts Inženiera un Pasūtītāja apstiprinājums.
7. 22;23;25 posmu realizāciju (būvdarbus) rekomendēts veikt 2019./2020. gadā. Ziemas periodā darbus atļauts veikt, ja ir atbilstoši laika apstākļi, kā arī saņemts Inženiera un Pasūtītāja apstiprinājums.
8. Kopējais Līguma izpildes termiņš nedrīkst pārsniegt 2020. gada 1. decembri.
9. Defektu paziņošanas periods 7;10;11;12;14;15;16;19;20;24;28 posmam sākas tikai pēc visu minēto posmu nodošanas ekpluatācijā
10. Defektu paziņošanas periods 9; 13; 18;26;29;30;32;33 posmam sākas tikai pēc visu minēto posmu nodošanas ekpluatācijā
11. Defektu paziņošanas periods 8;17;21;22; 23; 25; 27;31 posmam sākas tikai pēc visu minēto posmu nodošanas ekpluatācijā
